












































आज मिति २०८२/०४/०८ गते बिहीबारका दिन यस रोड गाउँपालिकाको अध्यक्ष श्री मनि कुमार स्याङ्बो ज्यूको अध्यक्षता तथा देहाय बमोजिमको जनप्रतितनिधी एवम् कर्मचारीहरुको उपस्थितीमा रोड गाउँपालिकाको आ. व. २०८१/०८२ को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरियो ।

देहाय:

क्र.स.	नाम थर	पद	हस्ताक्षर
१	श्री मनि कुमार स्याङ्बो	अध्यक्ष	
२	श्री बिष्णुमाया खवास	उपाध्यक्ष	
३	श्री विनोद कुमार चौहान	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
४	श्री मनोहरी खड्का	१ नंवाध्यक्ष .	
५	श्री चन्द्र शेखर धिमिरे	२ नंवाध्यक्ष .	
६	श्री मातृका बराल	३ नंवाध्यक्ष .	
७	श्री राज कुमार लाप्चा	४ नंवाध्यक्ष .	
८	श्री दल बहादुर पुलामी	५ नंवाध्यक्ष .	
९	श्री सत्यम राई चौरासे	६ नंवाध्यक्ष .	
१०	श्री नानु तामाङ	कार्यपालिका सदस्य	
११	श्री मिनादेवी तामाङ	कार्यपालिका सदस्य	
१२	श्री लक्ष्मी नेपाली	कार्यपालिका सदस्य	
१३	श्री इन्दिरा देवी विश्वकर्मा	कार्यपालिका सदस्य	

१४	श्री युवराज खामुवा राई	कार्यपालिका सदस्य	
१५	श्री दया कुमारी दियाली	कार्यपालिका सदस्य	दंड्या
१६	नेत्र प्रसाद पौडेल	प्रशासन शाखा उपमुख्य	
१७	मिडमालिणी शीपा	पशु पक्षी रक्षकालय विद्यार्थी शाखा उपमुख्य	
१८	शुक्ति कुमारी तामाड.	शिक्षा शाखा उपमुख्य	
१९	दिपक आंधारी	प्रशासन शाखा उपमुख्य	
२०	पवित्रा थापा	कृषि शाखा उपमुख्य	
२१	सुरभि गुल्ड.	रौतमठ सेवा केंद्र रौतमठ संयोजक	
२२	रोशन भट्टराई	स्व. प्र. ३४	
२३	मनिष भट्टराई	लेखा शाखा उपमुख्य	
२४	नारायण अर्याल	कंप्यूटर अपरेटर अधिकृत स्तर होल	
२५	युवराज काम्ले	स्वास्थ्य शाखा	
२६	राधिका तामाड.	महिला शाखा उपमुख्य	
२७	पद्म बहादुर शेकपा	कृषि शाखा	
२८	कुशल चौतम	सुनी शाखा	
२९	मुकुंदा दहाल	भूमी शाखा	
३०	रुपल पुलामी	//	
३१	वसुदेव राई	प्रबंधक शाखा	

३२	बिनोद सिंह कोहरा	ना. प्रा. ० १०	
३३	पुजा दाहाल	प्रा. ० १०	
३४	मोहन कुमार अधिकारी	ना. प्रा. ० १० (कृषि)	
३५	श्याम रश्मि	एकल महिला प्रा. ० १० (कृषि)	
३६	अनिता शर्मा	उद्यम महिला नरकर्मिणी	
३७	विनिता शर्मा	फिल्ड सहायक	
३८	भवानी कला राई	वि. वि. आ. र. प्र.	
३९	भुषा कुमारी	अ. स. र. स.	
४०	रुपा राई	वि. वि. आ. र. प्र.	
४१	सुनिता लिम्बु	वि. वि. आ. र. प्र.	
४२	डा. पुरुषोत्तम गौतम	भैरौखोरी इकाई	
४३	रत्ना शर्मा	प्रा. ० १० (कृषि)	
४४	उज्वल शर्मा	उज्वल भुमि शाखा	
४५	सखीरा पौडेल	डा. स. र. स.	
४६	सोमाकांत शर्मा	ल. स. र. स.	
४७	रश्मि कुमारी शर्मा	का. स.	
४८	शैलजा कार्की	का. स.	
४९	अमित शर्मा	का. स.	

आ.व २०८१/०८२ को आर्थिक प्रशासन शाखाको वार्षिक समिक्षा

प्रस्तुतकर्ता:
मनिष भट्टराई
लेखा शाखा प्रमुख
रोड गाउँपालिका, इलाम

आ.व. २०८१/०८२ को संघीय सरकार तर्फको आय

क्र. सं.	शिर्षक	प्रस्तावित आय	बास्तविक आय	आम्दानी प्रतिशत	मौज्दात रू. हजारमा)
१	समानीकरण अनुदान	८,८९,००,०००.	८,१५,७४,६४०.	९१.७६	७३,२५,३६०.
२	शशर्त अनुदान चालु	१८,७१,१०,५००.	१६,५६,८८,६३६.१९	८८.५५	२,१४,२१,८६३. ८१
३	शशर्त अनुदान पुँजिगत	२,८२,८४,०००.	१,६३,४५,६९६.६८	५७.७९	१,१९,३८,३०३. ३२
४	विशेष अनुदान पुँजिगत	२,९०,००,०००.	२,८९,९२,८०६.	९९.९८	७,१९४.००
५	समपुरक अनुदान पुँजिगत	१,५०,००,०००.	१,४८,१२,७१४.८६	९८.७५	१,८७,२८५.१४

आ.व. २०८१/०८२ को प्रदेश तर्फको आय

क्र. सं.	शिर्षक	प्रस्तावित आय	बास्तविक आय	आम्दानी प्रतिशत	मौज्दात रू. हजारमा)
१	समानीकरण अनुदान	५२,९२,०००.	५२,९२,०००.	१००	०
२	शशर्त अनुदान चालु	३४,२७,०००.	२६,८२,३३९.	७८.२७	७,४४,६६१.
३	शशर्त अनुदान पुँजिगत	१,४९,६४,०००.	८३,०४,१२४.३३	५५.४९	६६,५९,८७५.६७
४	समपुरक अनुदान पुँजिगत	१,००,००,०००.	९८,०१,८८४.६	९८.०२	१,९८,११५.४

आ.व. २०८१/०८२ को राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक तर्फको आय

क्र. सं.	शिर्षक	प्रस्तावित आय	बास्तविक आय	आम्दानी प्रतिशत	मौज्दात रू. हजारमा)
१	राजस्व बाँडफाँड	८,९३,६४,०००.	८,००,००,५३६.२९	८९.५२	९३,६३,४६३.७१
२	आन्तरिक श्रोत	५,०९,६५,३००	२,३७,१६,९८२.६२	४६.५४	२७२,४८,३१७.३८

चालु र पूँजीगत खर्चको अवस्था

क्र. सं.	शीर्षक	बार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
१	चालु	३३,९३,१३,६१९. ००	२७,८९,९४,३३२.००	८२.२२	६,०३,१९,२८७. ००
२	पूँजीगत	२१,७५,७२,१८१. ००	१६,५३,४६,१३०.२४	७६	५,२२,२६,०५०. ७६
	जम्मा	५५,६८,८५,८००. ००	४४,४३,४०,४६२.२४	७९.७९	११,२५,४५,३३७. .७६

२०८१/०८२ को भुक्तानी दिन बाँकीको विवरण

क्र.सं.	शिर्षक	रकम	कैफियत
१	चालु	१,११,५५,६५९.८५	
२	पुँजिगत	७९,०३,१५६.००	
	जम्मा	१,९०,५८,८१५.८५	

क्षेत्रगत खर्चको विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र/उप क्षेत्र	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
१	आर्थिक विकास	७,२४,४८,४००.००	३,९४,३७,५६५.००	५४.४४	३,३०,१०,८३५.००
२	सामाजिक विकास	२५,२२,०३,४५०.००	२१,७५,९३,८९८.३४	८६.२८	३,४६,०९,५५१.६६
३	पूर्वाधार विकास	११,७९,६४,७९४.००	९,७२,६२,८१३.७३	८२.४५	२,०७,०१,९८०.२७
४	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	१,६८,४४,०००.००	६३,२९,८१०.८६	३७.५८	१,०५,१४,१८९.१४
५	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	९,७४,२५,१५६.००	८,३७,१६,३७४.३१	८५.९३	१,३७,०८,७८१.६९

समस्याहरू

१. केही शिर्षकमा अवण्डा बजेट राखिएको,
२. राजश्वको कुल आम्दानीको अनुपात भन्दा तेब्बरसम्म आन्तरिक राजस्व प्रक्षेपण गर्ने गरिएको,
३. विनियोजित बजेट भन्दा दोब्बर बढी रकम सम्म का.पा.को निर्णय बमोजिम आर्थिक सहायता वितरण गरिएको,
४. स्रोत सुनिश्चितताको अवस्था नहेरी विनियोजनको आधारमा खर्च गरिएको हुनाले ठुलो रकम भुक्तानी दायित्व सिर्जना भएको,
५. आवश्यक खर्च शिर्षकमा बजेट विनियोजन नगरी तथा केही शिर्षकमा आवश्यक भन्दा बढी विनियोजन भएको।

समस्या समाधानको उपायहरू

१. आवश्यक योजना समयमै निश्चित गरी अवण्डा प्रकृतिको बजेट नराख्ने,
२. राजश्वको कुल आम्दानीको अनुपातको आधारमा राजश्व अनुमान गर्ने,
३. का.पा.को निर्णय बमोजिम आर्थिक सहायता वितरण लगायतका वितरणमुखी कार्यमा नियन्त्रण गर्दै जाने,
४. स्रोत सुनिश्चितताको आधारमा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति विकास गर्ने,
५. खर्च शिर्षक अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने,
६. आर्थिक अनुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने।

केही जिज्ञासा??




धन्यवाद



Rong Rural Municipality
Office of Rural Municipal Executive



नमस्कार
एवं
हार्दिक स्वागत



Welcome and Namaste





Rong Rural Municipality
Office of Rural Municipal Executive



आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गोष्ठी

२०८२ साउन ८ गते

रोड गाउँपालिका
प्राविधिक शाखा
पहरीगाउँ, ईलाम



Rong Rural Municipality
Office of Rural Municipal Executive



सडक

भवन

पाथिभरा मन्दिर

मर्मत सम्भार

सिँचाई



क्र. स.	बिवरण	सङ्ख्या	सम्झौता रकम	आर्थिक प्रगति	प्रतिशत
१	आर्थिक बर्ष २०७८-७९ मा ठेक्का मार्फत सम्झौता भएर सञ्चालन भएको	१			
२	आर्थिक बर्ष २०८०-८१ मा ठेक्का मार्फत सम्झौता भएर आर्थिक बर्ष २०८१-८२ मा सम्पन्न भएको	१			
३	आर्थिक बर्ष २०८१-८२ मा ठेक्का मार्फत सम्झौता भएर सोही आर्थिक बर्ष सम्पन्न भएका	१२			
४	आर्थिक बर्ष २०८१-८२ मा ठेक्का मार्फत सम्झौता भएर सञ्चालन भएका	५			
	जम्मा	१९			



रोड गाउँपालिकामा भएका सडकहरुको वर्गीकरण

सडक

P1

P2

P3



रोड गाउँपालिकाको P1 सडक

क्र स	सडक नाम	आईडि नं	सडक को लम्बाई कि मि	नालि लम्बाई	कालोपत्रे लम्बाई	ठेगाना	लगानी	कैफियत
१	तिनघरे शान्तिपुर नेहित देखी झापा सादुटार सडक	0	20			रोड १ सु न पा		
२	ढुङ्गे एकराते बदमटार खुदनाबारी सडक	1	11			रोड १,२		
३	बागखोर पहरिगाँउ याङ्गे बडहरे सडक	2	13			रोड ४,३११		
४	पहरिगाँउ ओझेलि मानाबुड कालिटा र भोटेटार सडक	3	11			रोड ४		
५	हर्कटे झण्डी सलकपुर निन्दा सडक	4	17			रोड ६ सु न पा		
६	सिद्धि,सलकपुर,निन्दा सडक	5	6			रोड ६		
७	हाँसपोखरी सारुपाखा नाखोपा वहुबन सडक	6	22			रोड ३ र ५		
	दैले कुवापानी लामिटा र सडक	7	13			रोड ६ सु न पा		
९	गौडा मुर्चुडे कुवापानी ढुङ्गे गोलाई सडक	8	15			रोड ५ र ६		
१०	बरभन्ज्याड,बरफल्याड झापा सडक	9	9			रोड १ र २		
जम्मा			137	0	0			

क्र स	ठेक्काको नाम	विनियोजित वजेट	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बित्तिय प्रगती	भौतिक प्रगती	कैफियत
१	सात न गोलाई	३ करोड	४,५३,४३,५१०।०३	२,३०,३४,७१९।००	२,२८,९०,५२९।५०	१००%	
२	सात न. गोलाई ii phase	६९,६५,२८१।००	९९,९६,९१७।४७	६३,२८,३१३।००	६२,३८,९१८।९५	१००%	
३	हासपोखरी बेसीसडक सडक	७७ लाख	१,०४,७१,८३९।४	५९,४९,२९४।००	५८,७४,७६४।८८	१००%	
४	हासपोखरी बेसीसडक ii Phase	१७,५०,७०६।००	१८,९९,४८४।१९	१८,१६,३२७।००	१७,२७,२५१।४१	१००%	
५	हर्कटे दैले सडक	७७ लाख	१,०८,९१,७३४	५४,७४,०७४।००	५४,४०,५०६।८३	१००%	
६	हर्कटे दैले ii Phase	२२,२५,९२६	२८,२०,४२४।४४	१९,०५,१७५।००	१८,९७,६५४।४३	१००%	
७	दिगो सडक योजना रोड -१ र २	६० लाख	८४,२७,३५८।११	४१,६४,६६५।०८	२८,२६,७१७।९०	६७.८७%	Ongoing
८	दिगो सडक विकास योजना रोड-३ र ४	६५ लाख	६४,९८,५३९।३३	३८,८८,६४२।९४	३४,२४,८२८।४७	८८.०७%	Ongoing
९	दिगो विकास सडक योजना, रोड-५	२८ लाख	२७,९८३३९।२६	२०,५७,१६६।६९	२१,१९,९१८।३४	१००%	
१०	दिगो सडक विकास योजना रोड- ६	३५ लाख	६९,९७,८२९।६५	३१,८९,५६८।७०	३१,७६,१०४।१२	१००%	
११	प्युरे सडक योजना रोड-४	२३ लाख ७५ हजार	२३,७४,७३९।४१	१७,४४,०३०।५५	१७,३५,४८७।९०	१००%	
	जम्मा रकम	६,७१,७५,०००	१०,८५,२०,५३७।४०	५,९३,१६,३१५।००	५,७३,५२,६८२।७३ (९६.६९%)		




Rong Rural Municipality
Office of Rural Municipal Executive



क्र स	ठेक्काको नाम	ग्राभेल (मिटर)	पक्की नाली	ग्यावियन	आर सी सी ढलाई	हुमपाईप/ कल्भर्ट	कैफियत
१	सात न गोलाई	११०४५	२७८०.६०	९७५	७०	९	
२	हासपोखरी बेसीसडक सडक	५२०	८५०	५७३		५	
३	हर्कटे दैले सडक	२४२६	६७५.५	४८.५		२६	
४	दिगो सडक योजना रोड-१ र २	१३००	३५४			३	
५	दिगो सडक विकास योजना रोड-३ र ४	१२४८	२६९	७०.५		४	
६	दिगो विकास सडक योजना, रोड- ५	०	२१०	६४		२	
७	दिगो सडक विकास योजना रोड- ६	३१५०					
८	प्युरे सडक योजना रोड-४	२२०	३२८	०		१	
९	प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम		१६३५				
१०	भाडाको मेसिन	१३०२०					
	जम्मा	३२९२९	७१०२.१०	१७३१	७०	५०	



Maps of P1 road

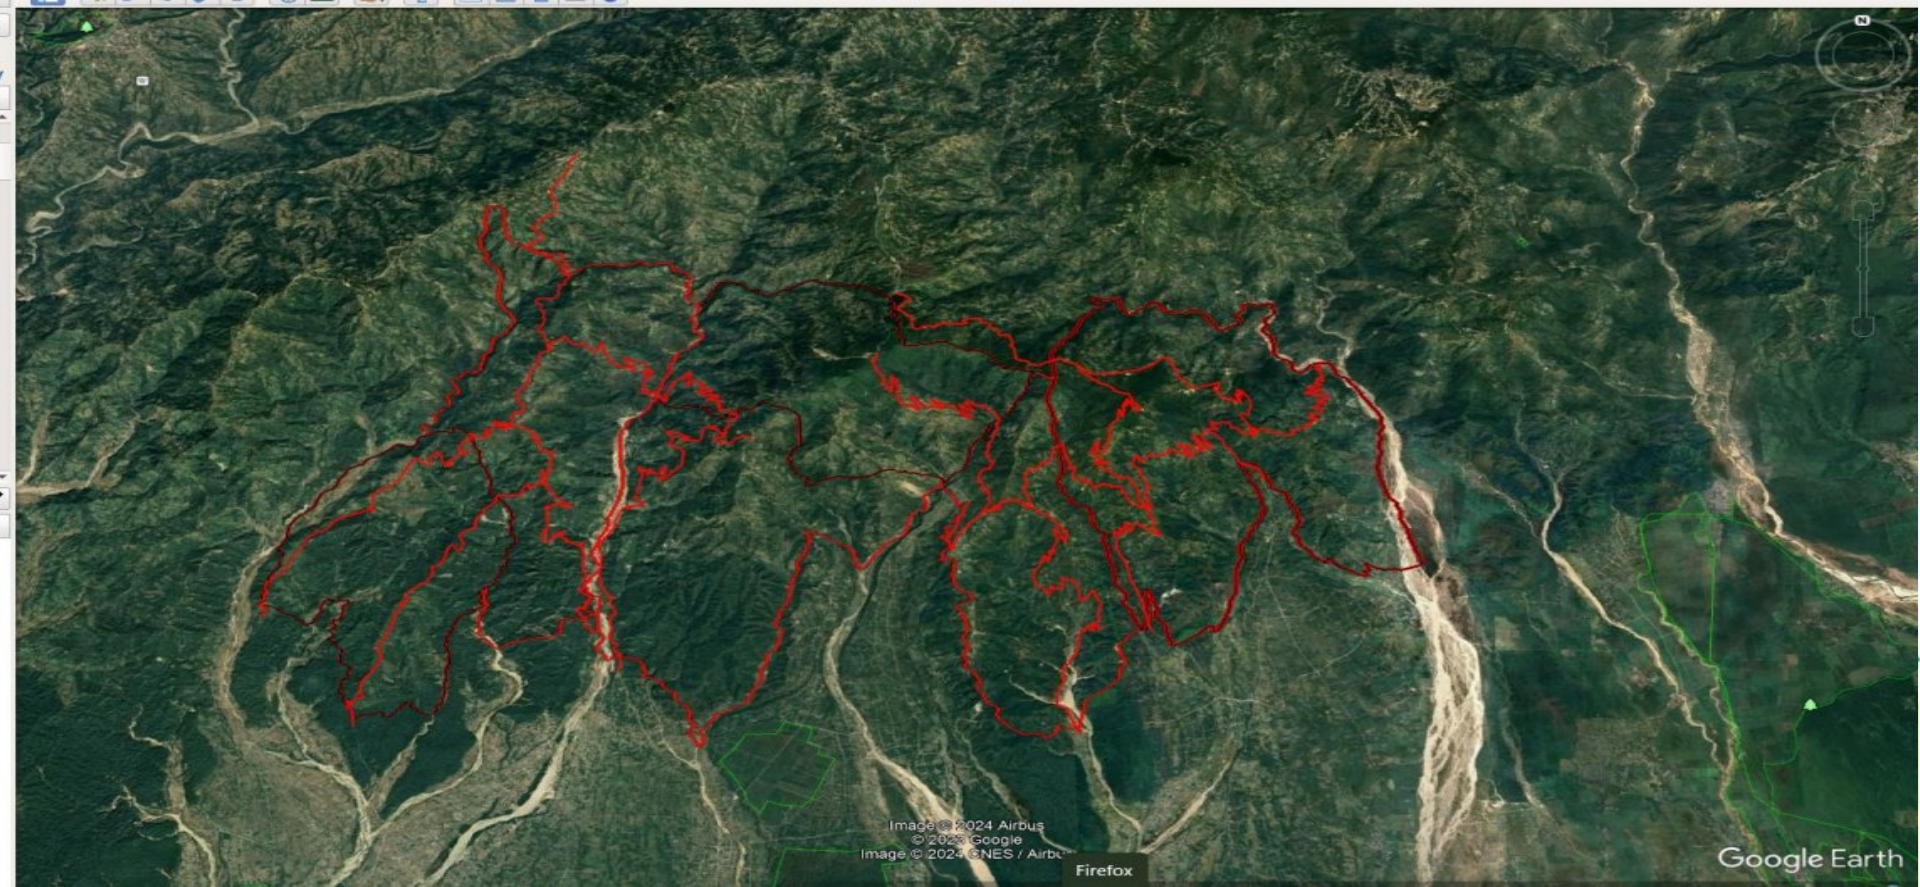



रोड गाउँपालिकाको P२ सडक

क्र स	सडक नाम	आईडि नं	सडक को लम्बाई	नालि लम्बाई	कालोपत्रे लम्बाई	ठेगाना	लगानी	कैफियत
१	बरफल्याड असुरे झटारे सडक	0	3			रोड २		
२	सलकपुर -सनसिटि भिलेज निन्दा सडक	1	8			रोड ६		
३	सलकपुर पाटापुर मदन भण्डारी सडक	2	4			रोड ६		
४	देसि गुरुड घर वरपिपल डाँडा सडक	3	4			रोड ६		
५	धजेडाँडा हाईड्रो अफिस तातोपझानि सडक	4	7			रोड ६		
६	स्कूलडाँडा आलेगोलाई सिद्धिखोला खर्बनि सडक	5	5			रोड ६		
७	जैबारी मनकामना मन्दिर वडा कार्यालय खलिपे सडक	6	5			रोड ६		
८	भट्टराई धारा टारी खेत गोपाल मेमे सडक	7	2			रोड ६		
९	तल्लो तारगाउँ आले ढुङ्गा चिलाऊने डाँडा सडक	8	7			रोड ६		
१०	वडा ५ कार्यालय देवनछाप चुल्ठे सडक	9	6			रोड ५		
११	चिसापानि सारुपाखा वडा ५ कार्यालय	10	7			रोड ५		




रोड गाउँपालिकाको P२ सडक

क्र स	सडक नाम	आईडि नं	सडकको लम्बाई	नालि लम्बाई	कालोपत्रे लम्बाई	ठेगाना	लगानी	कैफियत
१२	चिसापानी फुलपा डाँडा मुर्चुङ्गे सडक	11	3			रोड ५		
१३	लसुने, पिउरे, गौडा सडक	12	9			रोड ३ र ४		
१४	किटेनि, सालबोटे, कौशेटार सडक	13	8			रोड ४		
१५	सुव्वा भन्ज्याङ, वडहरे खोला सडक	14	6			रोड १		
१६	जुरे, खड्का गाउँ, लेप्चा गाउँ, बिरिङ खोला सडक	15	5			रोड १		
१७	बदमटार, दुधे, बरफल्याङ्ग सडक	16	5			रोड २		
१८	कुटीडाँडा, चिन्डेपानी, हर्कटे सडक	17	5			रोड ३		
१९	कुटीडाँडा, चामेटार सडक	18	6			रोड ३		
२०	सातगोलाई मासेँ सडक	19	6			रोड ३		
२१	सुनमाई, हल्लुडे, हडिया सडक	20	7			रोड ४		
२२	ट्युनडाँडा, तितुङ्गे, सुनमाई सडक	21	9			रोड ४		



Road maps p2

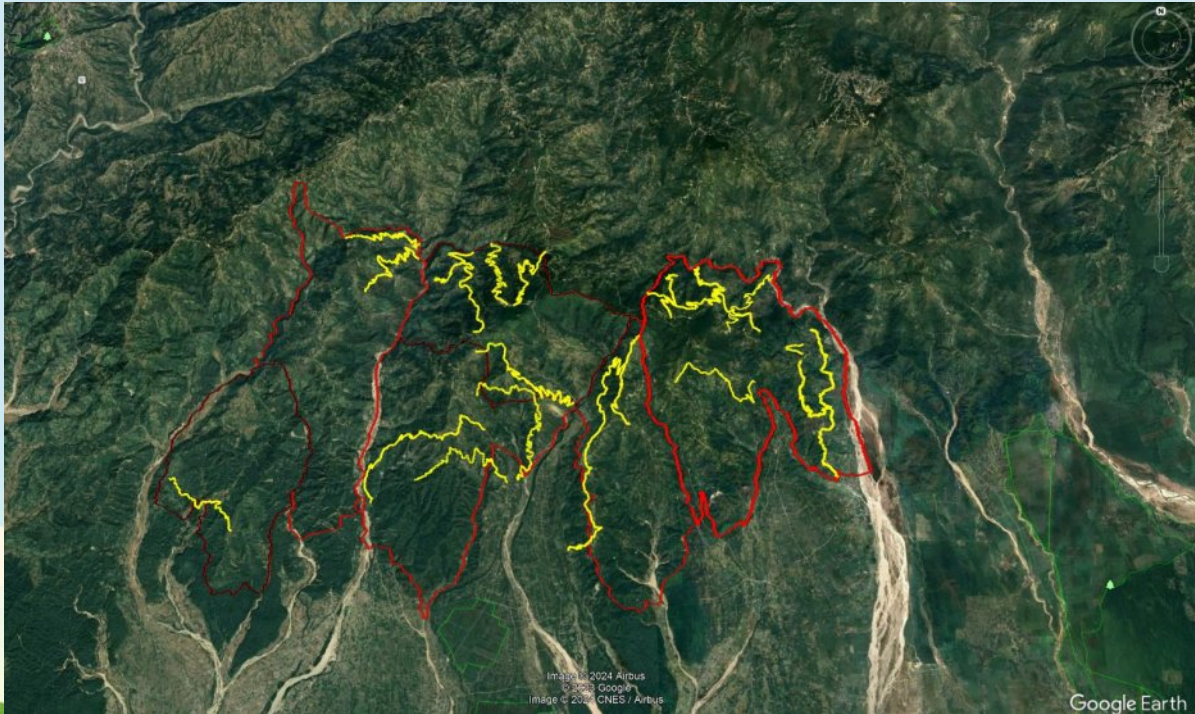



रोड गाउँपालिकाको P३ सडक

क्र स	सडक नाम	आईडि नं	सडक को लम्बाई	नालि लम्बाई	कालोपत्रे लम्बाई	ठेगाना	लगानी	कैफियत
1	हिटि धारा पशुसाखा सडक	0	1			४		
2	हडिया देखि बिरिङ खोला	1	7			४		
3	बाघ खोर देखि मानाबुङ	2	1			4		
4	फोकिट सडक	3	2			4		
5	सुब्बा भञ्ज्याङ देखी बिरिङ खोला सडक	4	6			1		
6	वडा १ अफिस लामकटेरि सडक	5	1			1		
7	चेनपुरे चाम्लिङ गाउँ गोयाङ खोला सडक	6	6			1		
8	शान्तिपुर दानाबोटे बिलन्दे सडक	7	4			1		
9	तिल्लरे कटहरे सडक	8	2			1		
10	दुध संस्था दुब्ले डाँडा गाउँ सडक	9	2			1		
11	सुब्बा भञ्ज्याङ दुब्ले सोताङ गाउँ सडक	10	2			1		
12	माथिल्लो बडहरे सडक	11	2			1		
13	खड्का गाउँ खरवन बडहरे	12	2			1		
14	जुरे शिरिसे सु.न.पा १३	13	2			1		



रोड गाउँपालिकाको P३ सडक

क्र स	सडक नाम	आईडि नं	सडक को लम्बाई	नालि लम्बाई	कालोपत्रे लम्बाई	ठेगाना	लगानी	कैफियत
15	शिरिसे सडक	14	2			1		
16	चेनपुरे लामिटार बदामटार सडक	15	4			1R2		
17	भालुझोडा-टिउसन डाँडा-प्युरे	16	3			4R३		
18	हर्कटे-तिनतले गाउँ	17	1			3		
19	लसुने -भाडटार	18	2			3R4		
20	अर्याल चोक-फोकिट सडक	19	3			3		
21	पवित्रा गोलाई-खमारे-सानो बुलु सडक	20	2			3		
22	सिम्ले -मालबाँसे-खमारे पुछार-बुलु सडक	21	4			3		
23	चामेटार-मासे शिरान-कट्टुसे सडक	22	2			3		
24	चामेटार-नेवारे-मासे	23	2			3		
25	जम्दारे-७ नं गोलाई	24	1			3		



26	पात्ले डाँडा-जम्दारे-कट्टुसे सडक	25	3			3		
27	लसुने-साम्पाड डाँडा	26	1			3		
28	हर्कटे -पाखागाउँ	27	2			3		
29	सिद्धि बगर सडक	28	7			6		
30	६ नं वडा देखि स्वास्थ्य चौकि सडक	29	1			6		
31	लिम्बु गाउँ देखि बन्सुवा	30	2			6		
32	कुवापानि देखि फाकफोक टार	31	2			6		
33	कुवापानि स्कुल देखि आरवि रोड	32	1			6		
34	निन्दा देखी तल्लो जिर्मले	33	4			6		
35	निन्दा शाखा रोड	34	2			6		
36	निन्दा सनसिटि जाने बाटो	35	2			6		
37	सविन ४ जाने बाटो	36	1			6		
38	तार गाउँ सडक	37	1			6		
39	रम्भ्याड स्वास्थ्य चौकि सडक	38	1			6		




40	रम्भ्याड साखा सडक	39	1			6		
41	आचार्य गाउँ देखि तार गाउँ सडक	40	2			6		
42	खर्क गाउँ मैनागौर सडक	41	3			6		
43	मेचि हाईवे वडा अफिस लिम्बुगाउँ सडक	42	1			4		
44	मिलडाँडा-नाखोपा	43	2			5		
45	मसार-टोकरोके सडक	44	1			5		
46	खम्बुटार-कटहरे-स्याडलेटार सडक	45	2			5		
47	बरफल्याड ढोडेनि बदामटार सडक	46	3			2		
48	दुधे गाँजाबारि सडक	47	1			2		
49	राई गाउँ देखि नेसुर गाउँ सडक	48	2			2		
50	भिमको घर देखि दुधे स्कुल	49	1			2		
51	लाप्चेटार सडक	50	1			2		
52	बदामटार बिच सडक	51	1			2		



53	सारुपाखा देखि गौडा	52	2			5		
54	बरफल्याड भित्रि सडक	53	1			2		
55	ईरौटार मिलडाँडा-गिरी डाँडा-चाम्लिङ्ग डाँडा-मलबाँसे	54	5			5		
56	गुल्लिडाँडा -चिउरी बिसाउने	55	3			5		
57	सुनपानि सडक	56	2			5		
58	नाखोपा देखी चिसापानि	57	3			5		
59	५ नं वडा देखी गौडा	58	1			5		
60	चिसापानि रिड रोड	59	5			5		
61	सुनपानि-रातमाटे डाँडा-स्याङ्ल्याडटार	60	2			5		
62	देवनछाप देखि पाउला चोक	61	2			5		
63	देवनछाप देखि बहुबन	62	7			5		
64	नाखोपा-मसार-सुनपानी	63	4			5		
जम्मा			153	0	0			



Road Maps P3

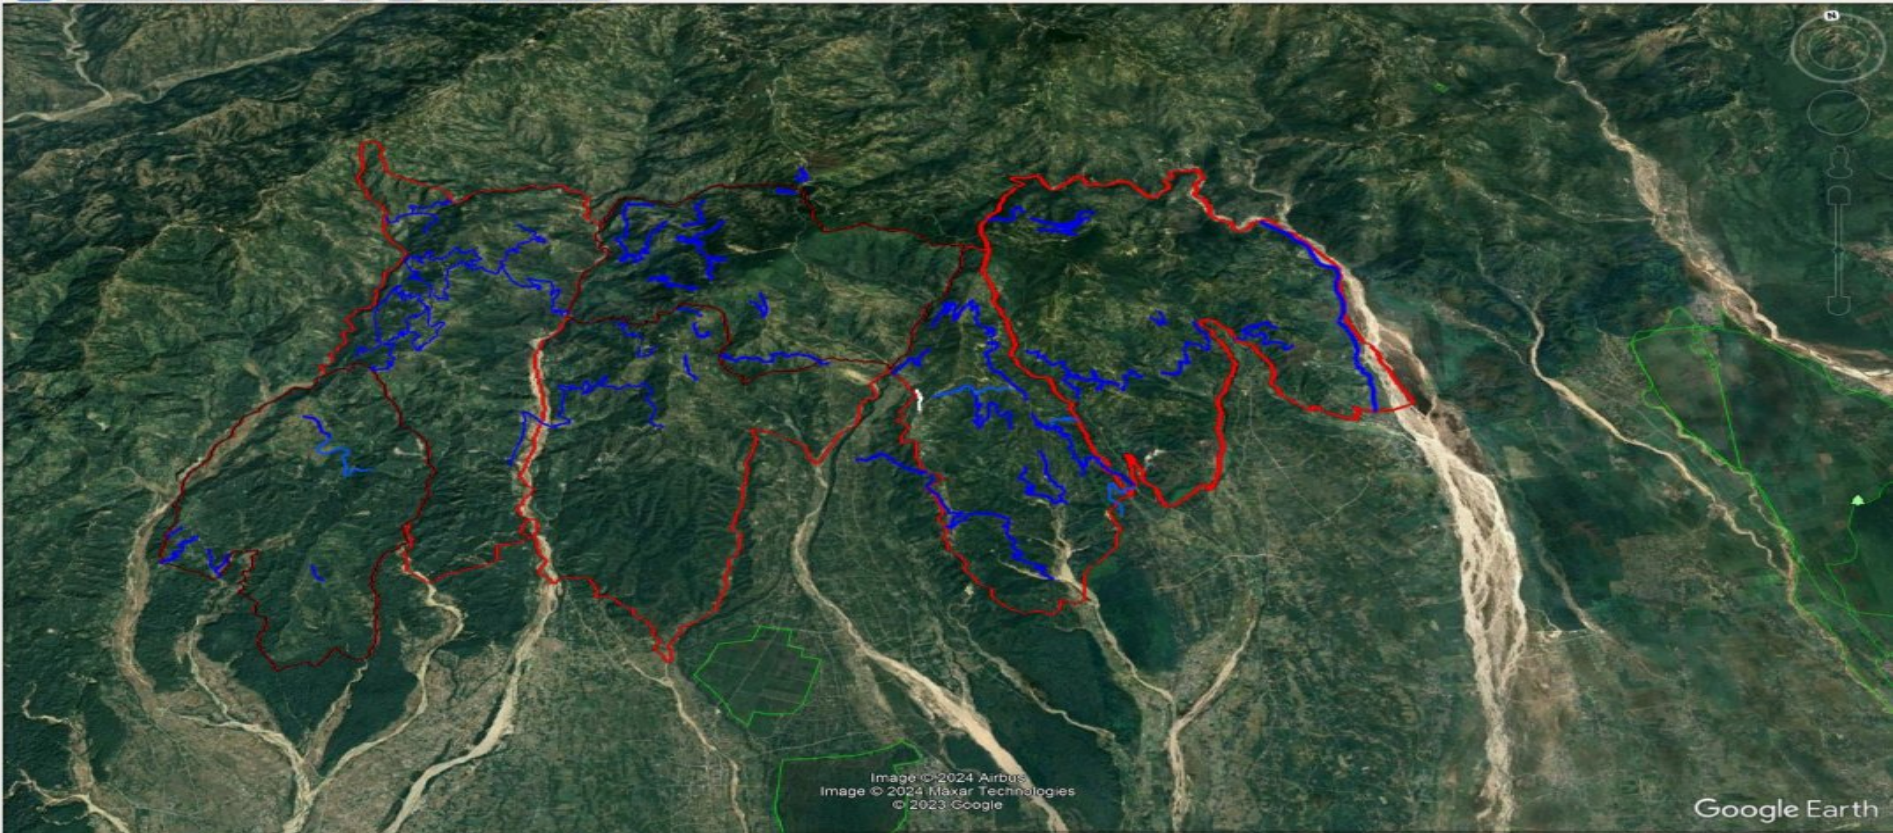



आ व २०७६-०७७ देखि २०७८-०७९ सम्म

आ व	योजनाको नाम	स्विकृत बजेट	खर्च भएको जम्मा रकम	लागत अनुमान भएको जम्मा रकम	बजेट भन्दा बढि भएको कामको रकम	ग्राभेल कि मि	पक्कि नालि र मि	हुमपाइप कलभर्ट ठाड	आर सि सि ढलाइ रोड र मि	बाटो चौडा कार्य कि मि	ग्यावियन घ मि
२०७६/०७७	टुडने एकराते बदामटार सडक	2,04,00,355.34				5	1500	22		6	100
२०७७/०७८	टुडने एकराते बदामटार सडक	2,50,00,000.00				3	800	5	44		300
२०७८/०७९	टुडने एकराते बदामटार सडक	2,03,51,972.33				0.80	1900	12	77	0.52	1180
	जम्मा	6,57,52,327.67				8.80	4200	39	121	6.52	1580





आ व २०७६-०७७ देखि २०८१-०८२ सम्म

आ व	योजनाको नाम	स्विकृत बजेट	खर्च भएको जम्मा रकम	लागत अनुमान	बजेट भन्दा बढि भएको कामको रकम	ग्राभेल कि मि	पक्कि नालि र मि	हुमपाइप कल्भर्ट टाइ	आर सि सि ढलाइ रोड र मि	बाटो चौडा मि	कार्य कि मि	ग्वावियन घ मि
२०७६/०७७	हासपोखरि मझुवा सारुपाखा इरौटार बहुबन सडक										20.00	
२०७७/०७८	हासपोखरि मझुवा सारुपाखा इरौटार बहुबन सडक						500.00	7.00				800.00
२०७८/०८०	हासपोखरि मझुवा सारुपाखा इरौटार बहुबन सडक						100.00	6.00				748.00
२०७९/०८	हासपोखरि मझुवा सारुपाखा इरौटार बहुबन सडक	57,14,285.71	55,76,393	69,97,694.64	12,83,408.92	0.45	995.00	36.00				347.00
२०८०/०८१	हासपोखरि मझुवा सारुपाखा इरौटार बहुबन सडक	76,00,000.00	79,35,578.67	99,61,556.25	23,61,556.25	1.68	640.00	4.00				428.50
२०८१/०८२	हासपोखरि मझुवा सारुपाखा इरौटार बहुबन सडक	77,00,000.00	77,65,620.12	1,23,71,323.69	46,71,323.69	0.52	850	5.00		0.2		573
	जम्मा	2,10,14,285.71	2,12,77,691.89	2,93,30,573.89	83,16,288.86	2.13	3085	58		20.2		2916.5



आ व २०७६-०७७ देखि २०८१-०८२ सम्म



आ व	योजनाको नाम	स्विकृत बजेट	खर्च भएको जम्मा रकम	लागत अनुमान भएको जम्मा रकम	बजेट भन्दा बढि भएको कामको रकम	ग्राभेल कि मि	पक्कि नालि र मि	ह्युमपाइप/ कलभर्ट ठाउ	आर सि सि दलाइ रोड र मि	बाटो चौडा कार्य कि मि	ग्यावियन घ मि
२०७६/०७७	हर्कटे दैले जौवारि कुवापानि लामिटार सेलेडटार सडक									17.00	
२०७७/०७८	हर्कटे दैले जौवारि कुवापानि लामिटार सेलेडटार सडक					3.00	500.00	6.00		3.00	
२०७८/०७९	हर्कटे दैले जौवारि कुवापानि लामिटार सेलेडटार सडक						800.00	7.00		8.00	120.00
२०७९/०८०	हर्कटे दैले जौवारि कुवापानि लामिटार सेलेडटार सडक	85,71,428.57	81,25,079	1,28,11,317.58	42,39,889.01	0.50	700.00	8.00			300.00
२०८०/०८१	हर्कटे दैले जौवारि कुवापानि लामिटार सेलेडटार सडक	77,00,000.00	67,93,639.85	1,14,09,186.09	37,09,186	0.40	615.00	9.00	92.70		259.00
२०८१/०८२	हर्कटे दैले जौवारि कुवापानि लामिटार सेलेडटार सडक	77,00,000.00	7338161.26	1,37,12,158.44	60,12,157.56	2.426	675.5	26.00		0.26	48.5
	जम्मा	2,39,71,428.57	22256880.11	3,79,32,662.11	1,39,61,232.57	6.326	3290.5	56.00	92.70	28.26	727.5



आ व २०७९-०८० देखि २०८१-०८२ सम्म



आ व	योजनाको नाम	स्विकृत बजेट	खर्च भएको जम्मा रकम	लागत अनुमान भएको जम्मा रकम	बजेट भन्दा बढि भएको कामको रकम	ग्राभेल कि मि	पक्कि नालि र मि	ह्युमपाइप कल्भर्ट ठाड	आर सि सि दलाइ रोड र मि	बाटो चौडा कार्य कि मि	ग्यावियन घ मि
२०७९/०८०	७ नं गोलाइ मार्से सिम्ले सडक	1,60,00,000.00	1,43,55,462	2,65,43,705	1,05,43,705	0.70	700.00	13.00	136.00	3.00	500
२०८०/०८१	७ नं गोलाइ मार्से सिम्ले सडक	2,50,00,000.00	2,62,28,614	4,18,44,882	1,68,44,882	1.35	1400.00	25.00	104.00		1300
२०८१/०८२	७ नं गोलाइ मार्से सिम्ले सडक	3,00,00,000	2,93,63,032	5,53,40,427	2,53,40,427	11.50	2780.60	9	70		3598
	जम्मा	7,10,00,000.00	6,99,47,108	12,37,29,014	5,27,29,014	13.55	4880.6	47	310	31	5398



क्र स	ठेक्काको नाम	विनियोजित वजेट	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बित्तिय प्रगती	भौतिक प्रगती	कैफियत
१	कृषि उपज भवन प्रसोधन केन्द्र रोड १	७५०००००	९६,२१,९१३।३०	६२,१०,२००।३४	६२,०१,४४०।२१	१००%	
२	कृषि उपज भवन प्रसोधन केन्द्र रोड ६	७५०००००	८४,१२,०२०।०७	५७,१५,१९२।६१	५७,१२,७३६।८६	१००%	
३	शान्ति निकेतन	१०००००००	१,३६,९७,७९९।३८	९२,४८,१४८।२८	७७,०१,१७४।०८	१००%	
४	प्रमुख प्रशासकीय भवन	७,९६,७४,८५२।३६	७,९६,७४,८५२।३६	५,१४,२१,७२३।०८	४,४९,७१,९२१।४६	८७.४६%	Ongoing
५	कुट्टीडाँडा सार्वजनिक शौचालय	३४,८६,८३०।६१	३४,८६,८३०।६१	२९,८९,९३१।६७	२९,८९,९३१।६७	१००%	
६	कुट्टीडाँडा र हासपोखरी विउटीफिकेसन	७६,६६०६।८६	७६,६१,६०६।८६	४६,४१,९४४।५१			Ongoing
७	पाथिभरा मन्दिर आवास निर्माण	७९,७३,९४०।९६	७९,७३,९४०।९६	६८,२०,१८६।६०			Ongoing
८	पाथिभरा मन्दिर रिटेनिङ्ग वाल निर्माण	८२,५१,९९४।९७	८२,५१,९९४।९७	५०,१२,१०४।००			Ongoing
	जम्मा	५,२३,७४,३७२।५४	५,९१,०६,१०५।२९	४,०६,३७,६९०।१०			



विशेष अनुदान: लोपन्मुख, आदिवासी, जनजाति,
दलित, सिमान्तकृतवर्ग विशेष कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र



आ. व.	योजनाको नाम	विनियोजित वजेट	लागत अनुमान	सम्पन्नता रकम	बित्तिय प्रगती	बजेट भन्दा बढि भएको कामको रकम	भौतिक प्रगती	कैफियत
२०८०-८१	ईरौटार सामुदायिक भवन निर्माण रोड-५	2,900,000.00	3,255,878.43	2,662,074.75	2,982,626.89	355,878.43	१००%	आ. व २०८०-८१ मा ११५०००००
२०८०-८१	कृषि उपज भवन प्रसोधन केन्द्र १	4,300,000.00	5,455,659.53	4,016,458.38	4,216,578.32	1,155,659.53	१००%	
२०८०-८१	कृषि उपज भवन प्रसोधन केन्द्र रोड ६ सम्याउने काम	283,541.62	280,408.37	280,000.00	280,000.00		१००%	
२०८०-८१	गुन्द्रुक ट्रफ निर्माण रोड ५	816,276.25	816,276.25	816,276.25	816,276.25		१००%	
२०८०-८१	कृषि उपज भवन प्रसोधन केन्द्र ६	4,300,000.00	5,455,659.53	3,483,723.75	1,351,766.53	1,155,659.53	2131957 बजेट फ्रिज भएको	
२०८१-८२	कृषि उपज भवन प्रसोधन केन्द्र १	7,500,000.00	9,621,913.30	6,210,200.34	6,201,440.21	2,121,913.30	१००%	आ. व २०८१-८२ मा १५००००००
२०८१-८२	कृषि उपज भवन प्रसोधन केन्द्र ६	7,500,000.00	8,412,020.07	5,715,192.61	5,712,736.86	912,020.07	१००%	
२०८१-८२	खन प्रसोधन सामाग्री खरिद वितरण	187,000.00	187,000.00	187,000.00	187,000.00		१००%	
२०८१-८२	ईरौटार फ्याक्ट्रीमा भट्टी जडान	988,734.18	988,734.18	974,760.00	957,810.60		१००%	
२०८१-८२	गत आ व को भुक्तानी				2,131,957.22			
	जम्मा	26,500,000.00	34,473,549.66	24,345,686.08	24,838,192.88	7,973,549.66		26500000



विशेष अनुदान: लोपन्मुख, आदिवासी, जनजाति,
दलित, सिमान्तकृतवर्ग विशेष कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र



आ. व.	योजनाको नाम	विनियोजित वजेट	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बित्तीय प्रगती	बजेट भन्दा बढि भएको कामको रकम	भौतिक प्रगती	कैफियत
२०८०-८१	कृषि उपज भवन प्रशोधन केन्द्र १	4,300,000.00	5,455,659.53	4,016,458.38	4,216,578.32	1,155,659.53	१००%	
२०८१-८२	कृषि उपज भवन प्रशोधन केन्द्र १	7,500,000.00	9,621,913.30	6,210,200.34	6,201,440.21	2,121,913.30	१००%	
	जम्मा	11,800,000.00	15,077,572.83	10,226,658.72	10,418,018.53	3,277,572.83		
२०८१-८२	रवन प्रशोधन सामग्री खरिद वितरण रोड ४	187,000.00	187,000.00	187,000.00	187,000.00	-	१००%	
	जम्मा	187,000.00	187,000.00	187,000.00	187,000.00			
२०८०-८१	गुन्द्रुक ट्रफ निर्माण रोड ५	816,276.25	816,276.25	816,276.25	816,276.25	-	१००%	
२०८०-८१	ईरौटार सामुदायिक भवन निर्माण रोड-५	2,900,000.00	3,255,878.43	2,662,074.75	2,982,626.89	355,878.43	१००%	
२०८१-८२	इरौटार फयाक्ट्रीमा भट्टी जडान	988,734.18	988,734.18	974,760.00	957,810.60		१००%	
	जम्मा	4,705,010.43	5,060,888.86	4,453,111.00	4,756,713.74			
२०८०-८१	कृषि उपज भवन प्रशोधन केन्द्र रोड ६ सम्प्याउने काम	283,541.62	280,408.37	280,000.00	280,000.00	-	१००%	
२०८०-८१	कृषि उपज भवन प्रशोधन केन्द्र ६	4,300,000.00	5,455,659.53	3,483,723.75	1,351,766.53	1,155,659.53	१००%	
२०८१-८२	कृषि उपज भवन प्रशोधन केन्द्र ६	7,500,000.00	8,412,020.07	5,715,192.61	5,712,736.86	912,020.07	१००%	
	जम्मा	26,500,000.00	34,473,549.66	24,345,686.08	24,838,192.88	7,973,549.66		26500000



पाथीभरा मन्दिर



आ. व.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बित्तिय प्रगती	बजेट भन्दा बढि भएको कामको रकम	भौतिक प्रगती	कैफियत
2079-80	पाथिभरा मन्दिर तथा कुट्टीडाँडा व्यवस्थापन	4,000,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,000,000.00			
	पाथिभरा मन्दिर स्टल व्यवस्थापन	4,000,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,000,000.00			
2080-81	पाथिभरा मन्दिर अन्तर्गत पाथिभरा बरपर ब्लक निर्माण	8,252,360.00	8,319,640.00	8,319,640.00	8,252,360.00		१००%	
	हासपोखरी कृषी स्टल	6,324,233.00	6,474,816.81	6,474,816.81	6,324,233.00			
2081-82	कुट्टीडाँडा सार्वजनिक शौचालय	3,486,830.61	3,486,830.61	2,989,931.67	2,989,931.67	496,898.94	१००%	
	कुट्टीडाँडा र हासपोखरी विउटीफिकेसन	7,661,606.86	7,661,606.86	4,641,944.51				Ongoing
	पाथिभरा मन्दिर आवास निर्माण	7,973,940.96	7,973,940.96	6,820,186.60				Ongoing
	पाथिभरा मन्दिर रिटेनिङ्ग वाल निर्माण	8,251,994.97	8,251,994.97	5,012,104.00				Ongoing
	पाथिभरा हल व्यवस्थापन	137,497.00	152,664.24	152,664.24	137,497.00			
	पाथिभरा पुर्वाधार विकास कार्यक्रम	1,000,000.00	961,968.44	958,968.00	944,919.20			
	कुट्टीडाँडा प्रतिशालय सौन्दरिकरण	620,800.00	620,800.00	620,800.00	620,800.00			
	जम्मा	51,709,263.40	52,704,262.89	44,791,055.83	27,269,740.87	7,913,207.06		



आ व २०७९-०८० देखि २०८१-०८२ सम्म



आ. व.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बित्तिय प्रगती	बजेट भन्दा बढि भएको कामको रकम	भौतिक प्रगती	कैफियत
२०७९-८०	शान्ति निकेतन	10,100,000.00	13,099,634.04	10,300,000.00	10,100,000.00	2,999,634.04		
	नमुना विद्यालय गुणस्तर तथा भैतिक व्यवस्थापन	3,000,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,000,000.00	300,000.00		
२०८०-८१	शान्ति निकेतन	10,000,000.00	13,664,569.91	9,227,415.45	9,892,865.76	3,664,569.91		
	नमुना विद्यालय गुणस्तर तथा भैतिक व्यवस्थापन	3,000,000.00	3,266,379.77	3,266,379.77	3,000,000.00	266,379.77		
२०८१-८२	शान्ति निकेतन	10,000,000.00	16,226,507.89	11,776,856.69	10,000,000.00	5,897,799.38		
	नमुना विद्यालय गुणस्तर तथा भैतिक व्यवस्थापन	1,000,000.00	1,021,000.00	1,021,000.00	1,000,000.00	21,000.00		
	शान्ति निकेतन मा वि व्यवस्थापन	800,000.00	799,269.18	769,450.63	763,002.95			
	शान्ति निकेतन मा वि चिया रोपन कार्यक्रम	396,400.00	408,053.00	408,053.00	396,400.00	11,653.00		
		38,296,400.00	51,785,413.79	40,069,155.54	38,152,268.71	13,161,036.10		



बिसेष अनुदान: रोड गाउँपालिकाको ICT कार्यक्रम



आ. व.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बित्तिय प्रगती	बजेट भन्दा बढि भएको कामको रकम	कैफियत
२०७९-८०	रोड गा पा को ICT कार्यक्रम	8,000,000.00	7,756,614.87	5,747,180.00	5,747,180.00	2,015,593.87	
			1,908,231.00	1,902,072.00	1,902,072.00		
			350,748.00	350,748.00	350,748.00		
२०८०-८१	रोड गा पा को ICT कार्यक्रम	5,000,000.00	5,001,380.00	4,122,240.00	4,122,240.00	879,140.00	
			877,760.00	877,760.00	877,760.00		
२०८१-८२	रोड गा पा को ICT कार्यक्रम	14,000,000.00	16,098,440.81	13,931,431.00	13,931,431.00	2,167,009.81	
			68,569.00	68,569.00	68,569.00		
	जम्मा	27,000,000.00	32,061,743.68	27,000,000.00	27,000,000.00	5,061,743.68	



आ व २०८१-०८२ ठेक्का मार्फत सम्झौता:

क्र. स.	विवरण	सङ्ख्या	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	बजेट भन्दा बढि भएको कामको रकम	कैफियत
१	पुर्वाधार बिकास	१७	१६,४३,७९,६०७.४०	९,७०,२०,४९७.३६	६,७३,५९,११०.३६	
२	ICT	१	१,६०,९८,४४०.८१	१,३९,३१,४३१.००	२१,६७,००९.८१	
३	औसधी खरिद	२	२८,८२,०१५.८४	९७९२५०.००	१९,०२,७६५.८४	
	जम्मा		१८,३३,५९,०६४.००	१,१९,९३१,१७८.३६	७,१४,२८,८८५.७०	





साना सिचाई योजना



सि.न.	योजनाको नाम	वडा नं.	सिंचित क्षेत्र		घरधुरी संख्या	सम्झौता रकम	स्वीस सरकारले व्यहोरेको रकम	सघिय सरकारले व्यहोरेको रकम	प्रदेश सरकारले व्यहोरेको रकम	स्थानिय सरकारले व्यहोरेको रकम	उपभोक्ता समितिले व्यहोरेको रकम	भौतिक प्रगति
			GCA	CCA								
1	रम्भ्याङ आहाले ढुङ्गा सिँचाई योजना	6	31.9	27	49	68,67,497.22	20,60,249.166	13,73,499.444	13,73,499.44	13,73,499.444	68,67,49.722	१००%
2	नाखोपा पुच्छरगाउँ ज्यमिरे मसार सिँचाई योजना	5	6.54	6	15	28,58,254.71	8,57,476.413	5,71,650.942	5,71,650.942	5,71,650.942	2,85,825.471	१००%
3	तेलपानी खोला कटहरे सिँचाई योजना	5	32.31	26	22	63,90,096.21	19,17,028.863	12,78,019.242	12,78,019.24	12,78,019.242	6,39,009.621	१००%
4	झटारे सिँचाई योजना इलाम २	2				9,79,334.0	2,93,800.2	1,95,866.8	1,95,866.8	1,95,866.8	97,933.4	१००%
5	कालिटार नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाई योजना इलाम ४	4	19.5	17	39	71,01,112.9	21,30,333.87	14,20,222.58	14,20,222.58	14,20,222.58	7,10,111.29	५५.५३%
			90.25	76	125	2,41,96,295.04	72,58,888.51	48,39,259	48,39,259	48,39,259	24,19,629.5	

GCA: Gross Command Area, CCA: Culturable Command Area



संघीय आयोजना: सुकेनिन्दा खोला सिँचाई योजना

- आयोजना सञ्चालित क्षेत्र: रोड गाउँपालिका-५, बहुवन
- सिँचित क्षेत्र NCA = 70 हेक्टर
- Catchment Area = 5 Sq. KM.
- सिचाई सुविधा उपयोग गर्ने घरधुरी संख्या : १२०
- सिचाई सुविधा उपयोग गर्ने जनसंख्या : ६०७

संघीय आयोजना: सिमसार क्षेत्र व्यवस्थापन तथा पोखरी निर्माण रोड-२, धप्परपोखरी

- सम्झौता रकम : ७१,५५,५६१।४९
- वित्तिय प्रगती : ६९,०६,६४३।७७ (९६.५२%)

क्षेत्रफल

१४ रोपनी





आ. व. २०८१-८२ मा उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन भएका योजना

सि.न.	वडा नं.	आयोजना (संख्या)	सम्झौता रकम	गाउँपालिकाको जम्मा लागत रकम	उपभोक्ता समितिको जम्मा दायित्व रकम	भौतिक प्रगति
१	१	१५	५६,१५,२४०.३४	४६,५२,७८४।०९	१०,४२,४५६।२५	१००%
२	२	१४	३२,६८,२७४।००	२८,८१,९३८।००	३,८६,३३७।००	१००%
३	३	२२	७८,६८,४६४।००	६९,४०,६५०।००	९,२७,८१४।००	१००%
४	४	१६	३२,०४,८३४।९९०	२७,९७,२७४।४०	४,०७,५६०।५०	१००%
५	५	२१	५६,८५,८०४।०६	५२,६२,०००।००	४,२३,८०४।०६	१००%
६	६	२१	५६,०४,३८०।००	४७,४७,५८०।००	८,५६,८००।००	१००%
जम्मा		१०९	३,१३,२६,९९६।३४	२,७२,८२,२२६।०९	४०,४४,७७०।२५	



मेसिनवाट सञ्चालन भएका योजना



क्र. स.	विवरण	रकम
१	तेल	७२,४१,६६६।००
२	तलब भत्ता	१०,८६,९६४।००
३	मेसिन मर्मत	१९,५९,८९८।००
	जम्मा	१,०२,८८,५२८।००

- पाकिलाको मेसिनबाट जम्मा १ लाख ६० हजार घन मी एक्साभेसन भएको छ ।





भाडाको मेसिन तथा पालिकाबाट तेल भुक्तानि भएको योजना

क्र स	वडा	तेल	भाडा		जम्मा रकम	लुज ग्राभेल (मी)	ग्राभेल (मी)	जम्मा	कैफियत
			पालिका	उपभोक्ता					
१	१	१,२८,२५०।००	१,८९,३१४।००	५२,६८६।००	३,७०,२५०।००	२१०।००	१४१०	१६२०	
२	२	५,२०,२५०।००	१०,२४,०००।००	१,१७,००५।३२	१६,६१,२२५।००	३५००।००	०	३५००	
३	६	१६,५९,६३२.३४	०	०	१६,५९,६३२.३४	४९००	३०००	७९००	
४	६	५,५७,४०१।५०	०	०	५,५७,४०१।५०	१०३६४ घ. मी.			जिर्मले खेलमैदान
जम्मा								१३०२०	





फिल्डको फोटोहरु









Galaxy A54 5G











REDMA

0571072095, 1477









Galaxy A54 5G





चुनौतीहरू

● भौगोलिक चुनौतीहरू


- भिरालो, पहाडी, चुरे भू-भाग
- बाढी, पहिरो र भूकम्पीय जोखिम
- कमजोर माटो (landslide prone areas)

● आर्थिक चुनौतीहरू

- अपर्याप्त वा ढिलो बजेट
- न्यूनतम बोलकबोल (lowest bid) को असर

● सामाजिक चुनौतीहरू

- भूमि अधिग्रहणमा अवरोध
- स्थानीयको असहयोग वा विरोध
- जनचेतनाको कमी





समाधान



● भौगोलिक समाधानहरू

- भौगोलिक सर्वेक्षण र म्यापिङ: सडक निर्माण अघि Detailed Topographic Survey र भूगर्भ अध्ययन गर्नुपर्छ।
- **Slope Stabilization Techniques:** Gabion wall, retaining wall, vegetation stabilization प्रयोग गर्नु।
- **Natural hazard mapping:** पहिरो, बाढीको सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरेर वैकल्पिक मार्ग छनोट।

● प्राविधिक समाधानहरू


- गुणस्तरीय डिजाइन र DPR तयार पार्ने
- **Modern construction technologies:** Soil nailing, shotcrete, geogrid जस्ता प्राविधि प्रयोग गर्नु।
- दक्ष जनशक्ति उत्पादन: प्राविधिक तालिममार्फत स्थानीय जनशक्ति तयार गर्नु
- Bio Engineering technique should done.
- पूर्वाधार क्षेत्र योजनाहरू समयमा ठेक्काद्वारा सञ्चालन गर्नुपर्ने

● सामाजिक समाधानहरू

- जनचेतना अभिवृद्धि: सडक संरक्षण, अवरोध न्यूनीकरणका लागि जनसमुदायलाई बुझाउने।
- सार्वजनिक सहभागिता: Stakeholder consultation र GESI (Gender Equity and Social Inclusion) अपनाउने।
- न्यायसंगत मुआब्जा व्यवस्था: भूमि अधिग्रहणमा सहमतिका साथ काम गर्ने।
- टोल विकास समितिको सकरात्मक सुझाव र भुमीका आवश्यक पर्ने

● दिगो समाधानहरू

- **Environmentally friendly road construction**
- **Climate-resilient infrastructure** बनाउने
- **Routine Maintenance System** लागू गर्ने
- स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग: ढुंगा, गिट्टी, मजदुर स्थानीय प्रयोग गर्नु।





धन्यवाद
